


Proyecto » 147-0011-Reactivar-Huila- Cafe especial Timaná (Huila) » Febrero/2016

46,3%

1. Histórico

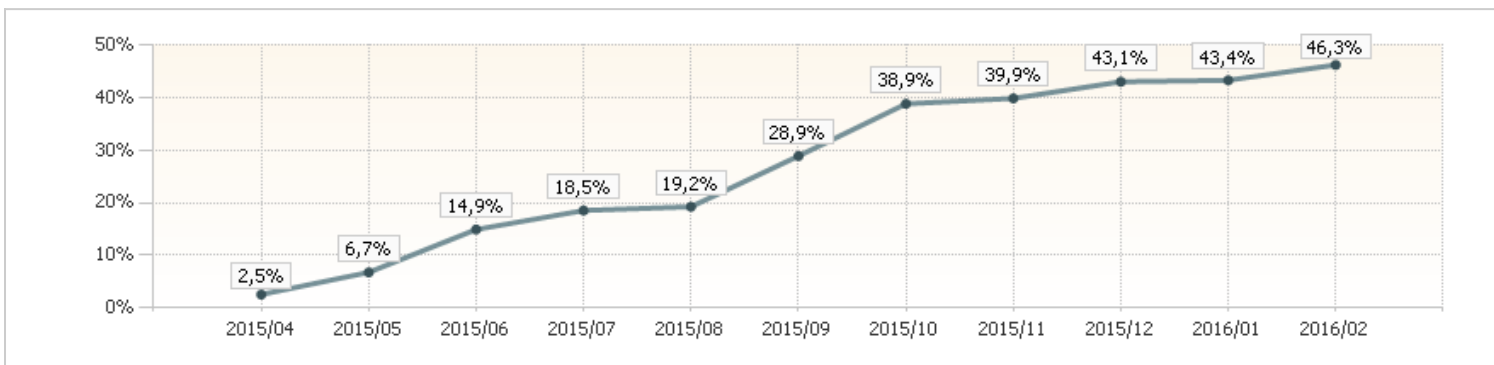

2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
0%	42,9%	57,5%

4. Avances

Propósito

Mejorar la productividad del cultivo de café especial en el municipios de Timaná % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de café producidos por hectárea.	0	2156	0%
Porcentaje de producción de café comercializado como café especial.	0	60	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 45,8%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de café sostenidas de manera tecnificada anualmente.	646	960	67,3%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	56	80	70%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	0	80	0%

Comercialización % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	80	0%

Fortalecimiento socio empresarial			% de avance: 48,8%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	1	1	100%
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	37	80	46,2%
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	65	80	0%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo			% de avance: 51,2%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	52	160	32,5%
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	56	80	70%

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción			% de avance: 75%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	3	4	75%
Número de planes de fertilización implementados	134	160	83,8%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	650	960	67,7%
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	646	960	67,3%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	650	800	81,2%

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.			% de avance: 0%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de alianzas comerciales y convenios suscritos	0	1	0%
Número de talleres a organizaciones para la implementación de un modelo de comercialización del producto	0	4	0%

c1. Foro Inicial			% de avance: 75%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	2	4	50%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	1	1	100%

c13. ICO Seguimiento			% de avance: 53,8%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	3	4	75%
Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales implementados.	52	160	32,5%

