


Proyecto » 147-0096-Reactivar-Tolima- Cafe- Líbano (Tolima) » Abril/2016 54%

1. Histórico

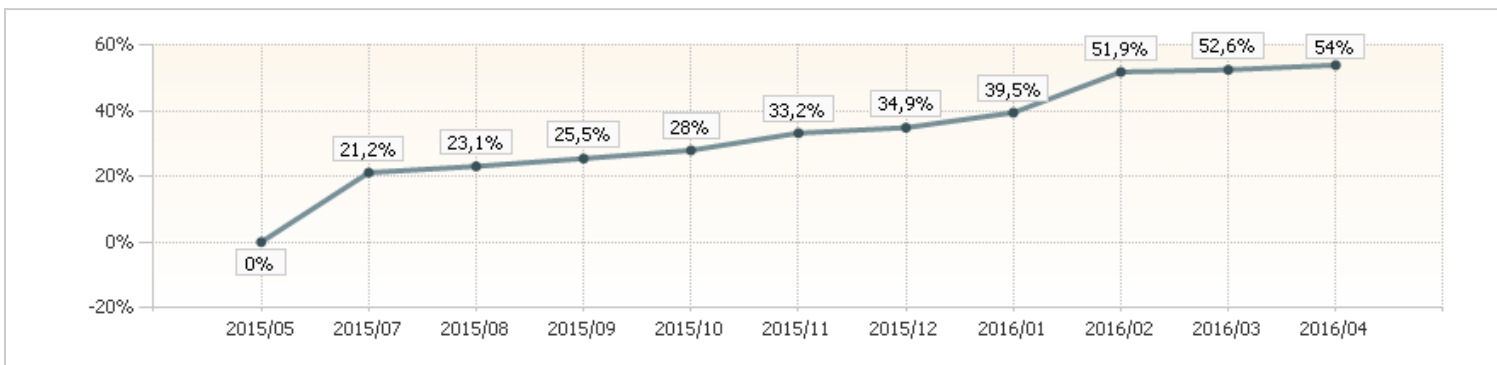

2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
0%	64,4%	55,3%

4. Avances

Propósito

Mejorar la productividad del cultivo de café especial en el municipio de Líbano. % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de café producidos por hectárea.	0	2300	0%
Porcentaje de producción de café comercializado como café especial.	0	80	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 96,8%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de café sostenidas de manera tecnificada anualmente.	199	200	99,5%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	72,7	80	90,9%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	80	80	100%

Comercialización % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	70	0%

Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 66,7%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	0	1	0%
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	72,3	70	100%
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	1	1	100%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo % de avance: 44,5%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	0	160	0%
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	71,2	80	89%

Actividades

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización. % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de alianzas comerciales y convenios suscritos	0	1	0%
Número de talleres a organizaciones para la implementación de un modelo de comercialización del producto	0	20	0%

c13. ICO Seguimiento % de avance: 30,1%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	41	68	60,3%
Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales implementados.	0	200	0%

a. Actividades relacionadas con el componente de producción % de avance: 69,7%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	31	36	86,1%
Número de planes de fertilización implementados	30	200	15%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	197	160	100%
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	197	160	100%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	189	400	47,2%

c1. Foro Inicial % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	58	36	100%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	1	1	100%

