


Proyecto » 147-0080-Reactivar-Valle del Cauca-Platano-Ginebra (Valle del Cauca) » Marzo/2016

30,8%

1. Histórico

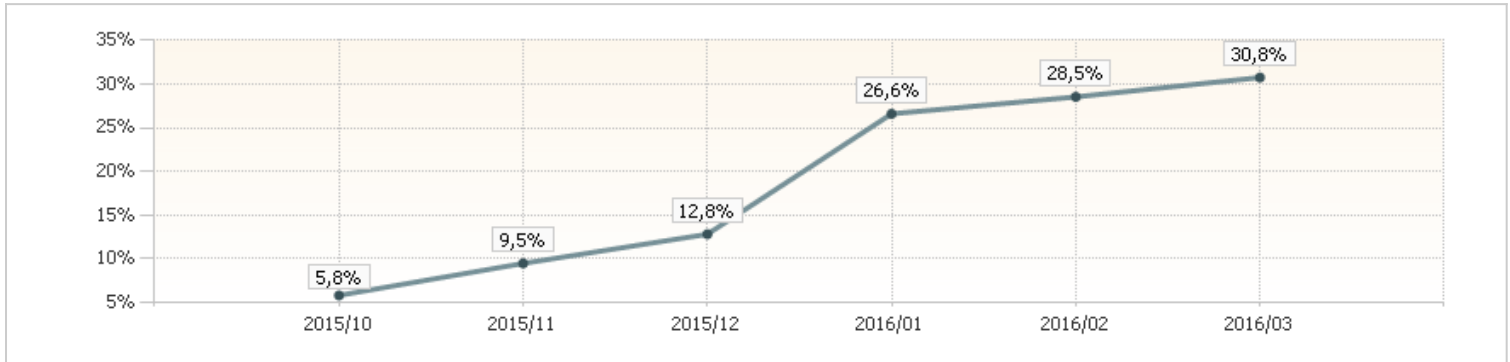

2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Fin	Proposito	Componente	Actividad
0%	0%	32%	43,6%

4. Avances

Fin

Mejorar la calidad de vida de pequeños productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Ingreso mensual promedio de los productores	360935	505309	0%

Propósito

Incrementar el rendimiento de plátano en los municipios de Ginebra y el Águila % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de piña producidos por hectárea anualmente	3000	7000	0%
Porcentaje de producción de plátano comercializado como plátano de primera calidad	0	5	0%
Porcentaje de producción de plátano comercializado como plátano de segunda calidad	0	5	0%
Porcentaje de producción de plátano comercializado en mercado local	100	75	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica		% de avance: 73,3%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Hectáreas de plátano sostenidas de manera tecnificada anualmente	77	55	100%	
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	63	70	90%	
Porcentaje de producción de plátano de primera calidad	15	50	30%	

Comercialización		% de avance: 0%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	0	2	0%	
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha, pos-cosecha y comercialización	0	70	0%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	70	0%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 50%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	78	70	100%	
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	12	65	0%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 0%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	0	60	0%	
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	0	70	0%	

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 69,9%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	2	15	13,3%	
Número de análisis de suelos realizados	220	158	100%	
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	154	75	100%	
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	525	790	66,5%	

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 6,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Modelo logístico de comercialización implementado	0	2	0%	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	0	10	0%	
Número de jornadas de promoción y seguimiento al aliado comercial realizadas.	2	10	20%	

c1. Foro Inicial		% de avance: 90%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	

Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	8	10	80%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	3	2	100%

c13. ICO Seguimiento

% de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	0	30	0%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	0	5	0%

Reporte REACTIVAR generado por Camila Cortes el 11/09/2026 6:57:25 p. m.
